

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年03月30日

計画の名称	鴻巣市における循環のみちの実現（防災・安全）（第2期）											
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	鴻巣市											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	670	A	670	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	ストックマネジメント実施方針及び計画策定の進捗率を0.0%（H30当初）から100.0%（R4末）に向上させる。 ストックマネジメント実施方針及び計画策定進捗率 策定までの検討済み項目（項目）/ 策定までに検討すべき項目（19項目）	0%	100%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく管渠の調査実施率を0.0%（H30当初）から12.1%（R4末）に向上させる。 ストックマネジメント計画に基づく管渠調査実施率 調査実施済み延長（m）/ 調査を実施すべき延長（414,804m）	0%	3%	12%
3	ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋改築実施率を0.0%（R3当初）から100%（R4末）に向上させる。 ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋改築実施率 改築済みマンホール蓋数（箇所）/ スtockマネジメント計画に基づくマンホール蓋改築必要数（1,400箇所）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
ストックマネジメント計画策定時に成果目標を定め、計画に基づき污水管路施設の点検調査を実施する。														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	-	改築	ストックマネジメント事業	ストックマネジメント実施方針及び計画策定、汚水管路施設の点検調査	鴻巣市						110	-	策定済	
		ストックマネジメント計画																		
	A07-002	下水道	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント事業(マンホール蓋改築)	マンホール蓋交換 N=1, 400箇所	鴻巣市						560		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
											小計						670			
											合計						670			

中間評価

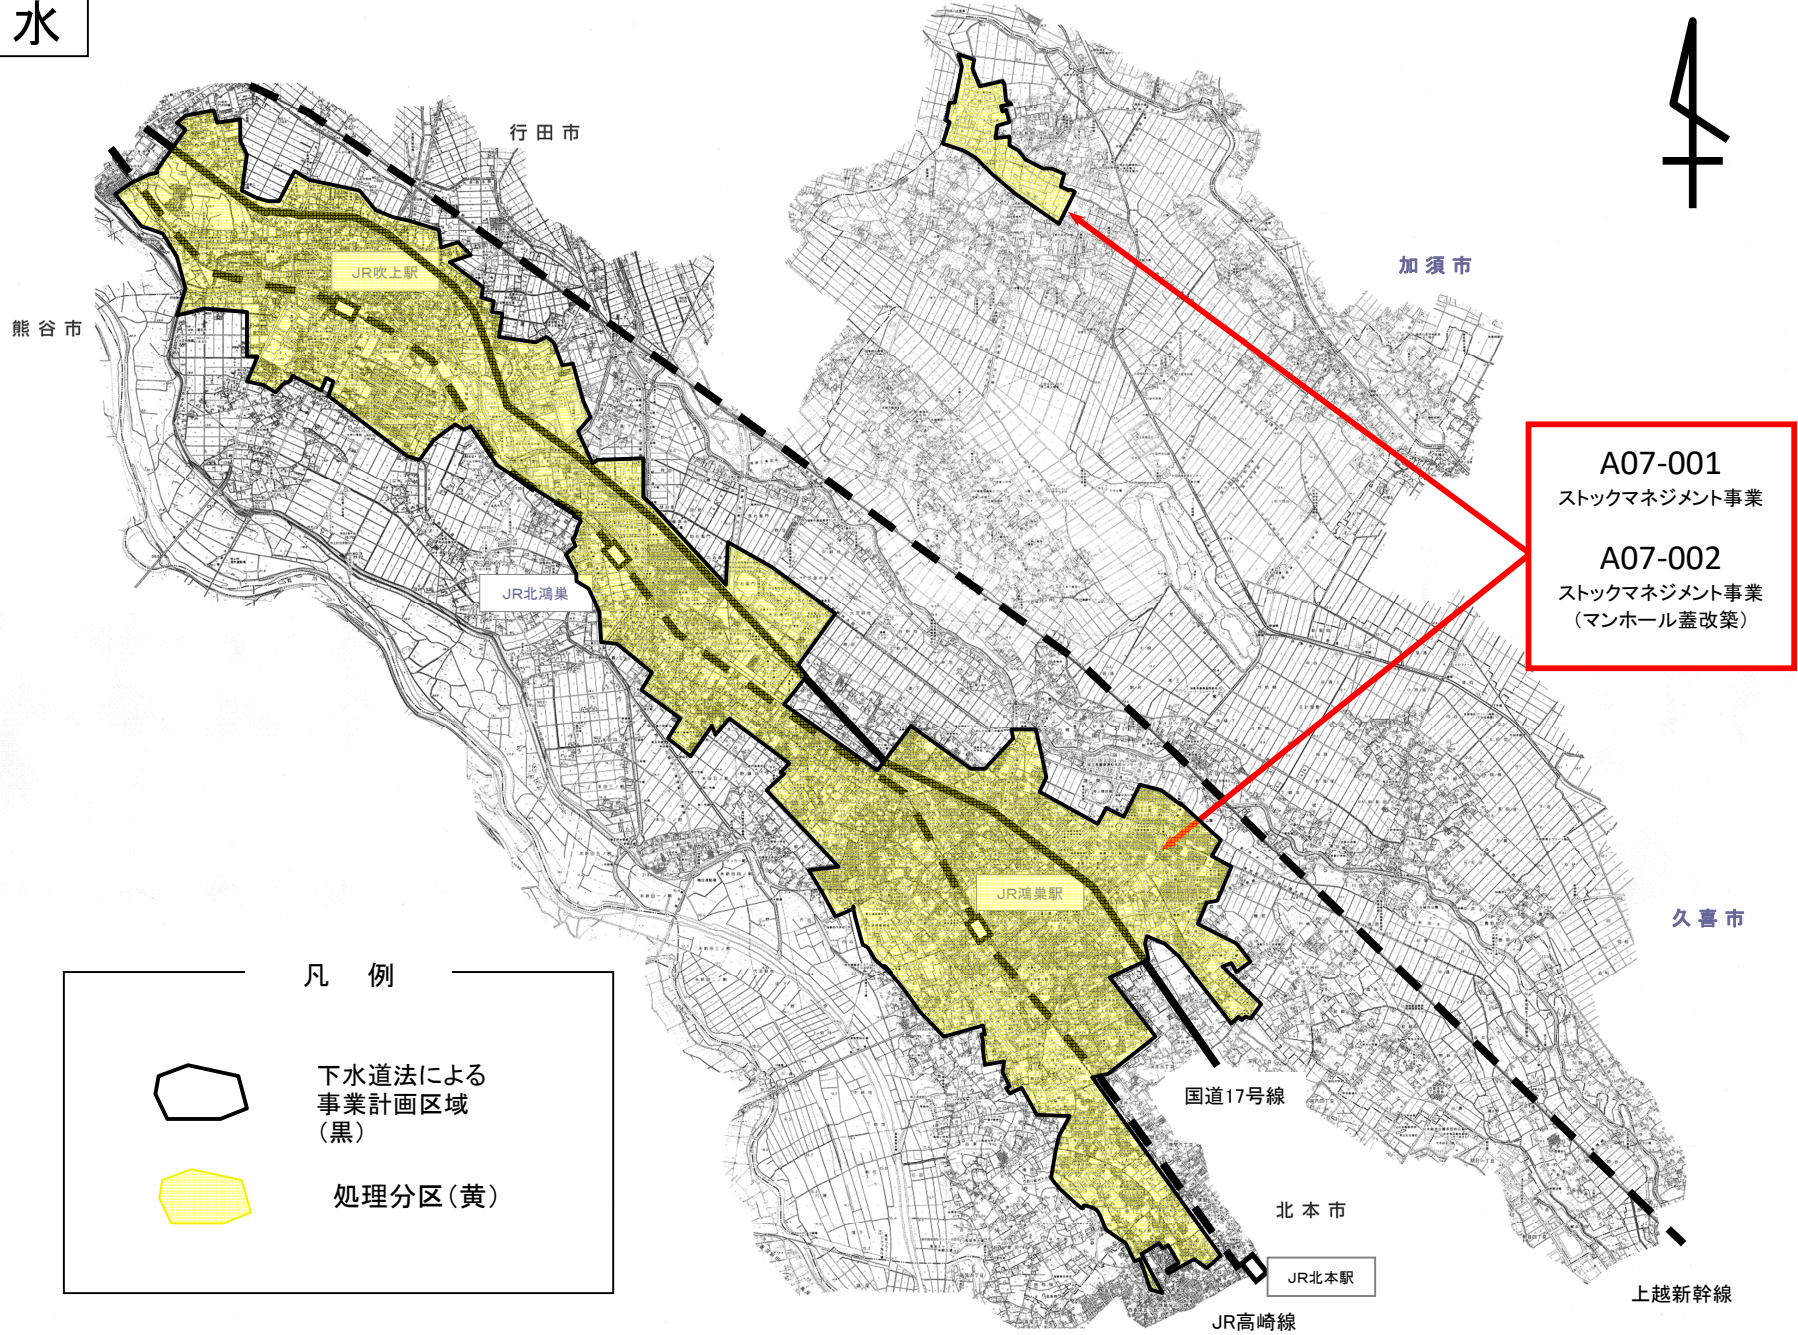
中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
鴻巣市社会資本総合整備計画事業評価実施要綱に基づき、都市建設部長を委員長とした事業評価委員会において、中間評価を実施します。	令和5年3月
	公表の方法
	鴻巣市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ストックマネジメント実施方針及び計画策定進捗率を0%（H30）から100%（R2）としたことで、管路の老朽化対策及び震災・不明水対策におけるリスクを軽減できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後もストックマネジメント計画に基づき、計画的な改築等に努め、施設の点検・調査・診断及びマンホール蓋の改築に取り組んでいきたい。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	ストックマネジメント実施方針及び計画策定進捗率	
	中間 目標値	100%
	中間 実績値	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく管渠調査実施率	
	中間 目標値	3%
	中間 実績値	3%
3	ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋改築実施率	
	中間 目標値	0%
	中間 実績値	0%



参考図面 社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称	鴻巣市における循環のみちの実現（防災・安全）（第2期）	交付対象	鴻巣市
計画の期間	平成30年度～令和4年度（5年間）		

汚水



凡 例

-  下水道法による事業計画区域(黒)
-  処理分区(黄)

**A07-001**  
ストックマネジメント事業

**A07-002**  
ストックマネジメント事業  
(マンホール蓋改築)
